

移動式クレーン作業計画書

事業所名

所在地

TEL

FAX

1.クレーン作業受注内容（太線枠内は受付時に記入、その他は運転士が記入）

受注日時	平成 年 月 日 時 分	受注者氏名				
受注先事業所			受注先担当者名	TEL		
受注内容						
作業予定期間	月 日 時 分	～	月 日 時 分	予定		
搬入クレーンの能力	最大吊上げ	ton	主ジブ長さ	m	補助ジブ長さ	m
	メーカー		機械別	トラック・ホイール・クローラ	機種名	
運転士氏名			委託事業所名・TEL			
発注者計画	作業場所			運転士確認	変更作業内容	運転士確認
	作業内容			良・否		良・否
	※アウトリガ					
	張出条件等					
最大荷重予定	ton	良・否	ton	良・否		
作業半径予定	m	良・否	m	良・否		
最大揚程予定	m	良・否	m	良・否		
現場責任者名			現場責任者確認			

搬入クレーンの能力は、現場の作業条件を満たしていますか。 良・否

2.作業現場の相互事前確認

				○印又は×印でチェック		
現場責任者名		合 図 者 名		手合図・笛・旗・無線・その他()		
作業指揮者名		玉 掛 け 者 名		玉掛けワイヤ良・否・その他()		
運 転 士 名		見張監視者名		安全通路表示・立入禁止措置・その他()		
安全装置確認	自動停止	警報装置	外部表示	外れ止め主・補	その他()	
解除キー保管責任者氏名						

3.移動式クレーン作業現場状況確認 (○印又は×印でチェック)

設置状況	設置地盤	敷板利用	旋回範囲(障害物)	架空電線対策	その他()	
アウトリガ張出状況	前後左右	その場張出	最小張出	中間張出	最大張出	固定ピン
車体機械廻り確認	駐車ブレーキ	車止め状態	責任者確認氏名			

禁止事項


安全装置解除・横引き・斜吊り・ジブ伸長走行・性能外吊り荷走行・平均風速10m/秒以上

- ※ 近隣の環境(学校・病院・住宅)に配慮し、運転席を離れる場合はエンジンをストップして下さい。
- ※ クレーンの設置場所変更などで移動する場合は、その都度上記2～3の項目を必ず確認して下さい。
- ※ 作業開始前点検は、メーカー様式、又はクレーン協会点検様式に従って下さい。

記載上の注意

1. 本『移動式クレーン作業計画書』は、移動式クレーンの転倒事故防止のため現場に搬入する移動式クレーンの能力が、現場の作業条件に合致するように作成するもので、作業計画書の目安として活用して下さい。
2. クレーン作業受注内容の『運転士確認』欄で否となった場合は、即時改善するようにして下さい。
3. 解除キーの保管は、現場搬入時に責任者が保管するようにして下さい。

アウトリガ張出しは最大にする

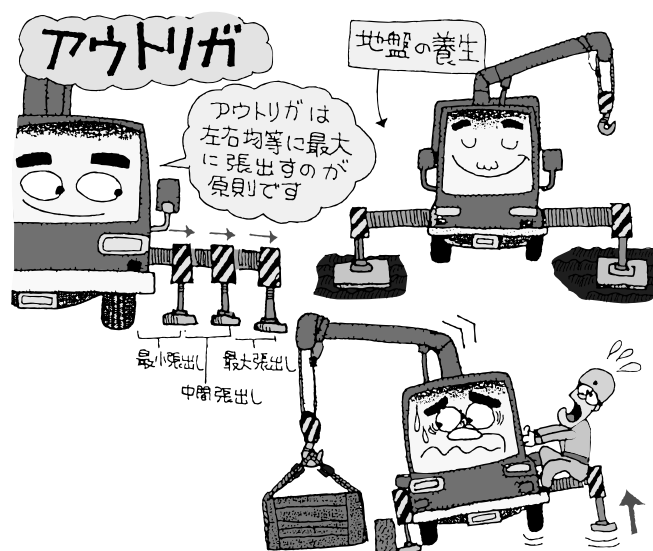

旋回すると吊り荷は遠くへ振り出される

旋回すると遠心力でつり荷は遠くへ振り出され、旋回速度が速いほどさらに遠心力は大きくなり、作業半径を増大させます。

従って、定格荷重に近い作業状態での速い旋回は、クレーンを転倒させる危険性があり、要注意です。

